

## Documentos de gestión de proyecto

Brayan Alejandro Cortes Jimenez Jaime Alberto Osorio

Joshua David Triana Madrid

Universidad del Valle Facultad de ingeniería Ingeniería de sistemas Tuluá 2022



# Contenido

1.	ESTIMACIÓN DEL PROYECTO	PAG 3
2.	PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	PAG 4
3.	GESTIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS	PAG 5



#### **ESTIMACIÓN DEL PROYECTO**

### Puntos por función

- Registrar beca (El 4 PF)
- Modificar beca (El 4 PF)
- Eliminar beca (El 4 PF)
- Búsqueda beca (EQ 4 PF)
- Listado de becas (EQ 4 PF)
- Listado de noticias new york times (EQ 6 PF)

Total: 26 PF

PFA = 26 \* [0.65 + (0.01\*32)] PFA = 25.22 = 25

Lenguaje 4ta generación: 8 Hora PF Promedio

H/H = 25 \* 8

H/H = 200 Horas hombre

5 horas diarias de trabajo

1 mes = 20 días

**Desarrolladores:** 2

**Horas =** 200 / 2 = 100 horas (Duración del proyecto en horas)

Días de trabajo = 100/5 = 20 días de trabajo

Meses = 20 / 20 = 1 mes para desarrollar el software de lunes a viernes 5 horas diarias con 2 desarrolladores

**Sueldo mensual desarrolladores = \$2.200.000** 

Otros costos del proyecto (Alimento, energía y gasto de hardware) = \$3.500.000

**Costo =** (2 \* 1 \* 2200000) + 3500000


Costo neto = \$7.900.000

Costo final del proyecto: (7.900.000\*40%) + 7.900.000

Costo total: \$11.060.000



## PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

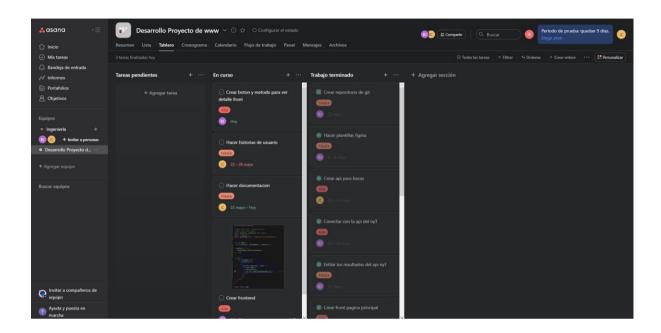



## **GESTIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS**

ld	Riesgo	Tipo	Fuente	Probabilidad	Impacto	Total	Estrategia
R1.	Fallo en el hosting donde se encuentre el aplicativo	Negativo	Externo	0.3	0.2	0.06	Asumir
R2.	Corrupción de los datos de prueba en la base de datos	Negativo	Interno	0.3	0.2	0.06	Prevención
R3.	Filtración del código fuente de la solución	Negativo	Interno	0.3	0.4	0.12	Asumir
R4.	Falla de comunicación entre los desarrolladores	Negativo	Interno	0.1	0.1	0.01	Prevención
R5.	Ampliación de plazo de entrega	Positivo	Externo	0.1	0.1	0.01	Asumir
R6.	Cambio de objetivo del proyecto (Solucionar otra problemática)	Negativo	Externo	0.1	0.8	0.08	Asumir
R7.	Pérdida del código fuente	Negativo	Interno	0.3	0.8	0.24	Prevención
R8.	Pérdida de la planeación y progreso de las tareas	Negativo	Interno	0.3	0.2	0.06	Prevención



	Pérdida d	del código fuente	
_			

**Descripción:** El proyecto entraría en altas complicaciones debido a la pérdida del código en proceso, lo cual desencadena muchos problemas de avance y retrasaría el proyecto.

Fuente: Interna.

La pérdida de la información del código fuente provocaría obstáculos en el desarrollo del proyecto puesto que se recurriría a copias de seguridad y si estas no existen, se iniciaría en el desarrollo del código perdido nuevamente.

#### Plan de contingencia: (Planificación de respuesta - Estrategia)

Prevención - Tener distintas copias de seguridad de toda la documentación y datos importantes para el proyecto, al igual que el almacenamiento del código en herramientas para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones como Github.

Asignado a: Jaime Osorio
